


Sprint 1 — Análise e Especificação

Período: 6 de maio a 13 de maio de 2026 Total de pontos: 21 Todas as tarefas foram concluídas


Planning Poker

Tarefa	Alan	Luís Henrique	Pontuação final
LIC-3 Elaborar documento de descrição do sistema	2	3	2
LIC-4 Especificações dos requisitos com histórias de usuário	3	3	3
LIC-9 Criar repositório Git	1	1	1
LIC-5 Diagrama de casos de uso	3	2	2
LIC-8 Diagrama de arquitetura da solução	2	2	2
LIC-7 Diagrama Entidade-Relacionamento	3	3	3
LIC-6 Protótipo de média fidelidade	5	3	3
LIC-10 Docker Compose com PostgreSQL e pgvector	3	5	3
LIC-11 Script SQL de criação do banco	2	2	2

Kanban (print do cronograma, pois no quadro ficou ruim pela quantidade de itens)

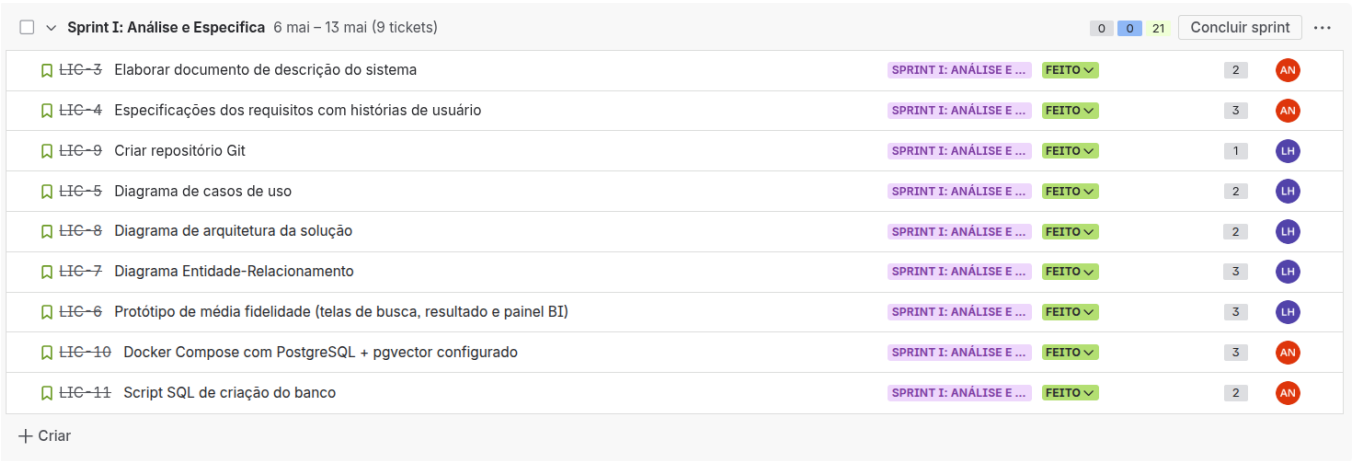

Burndown

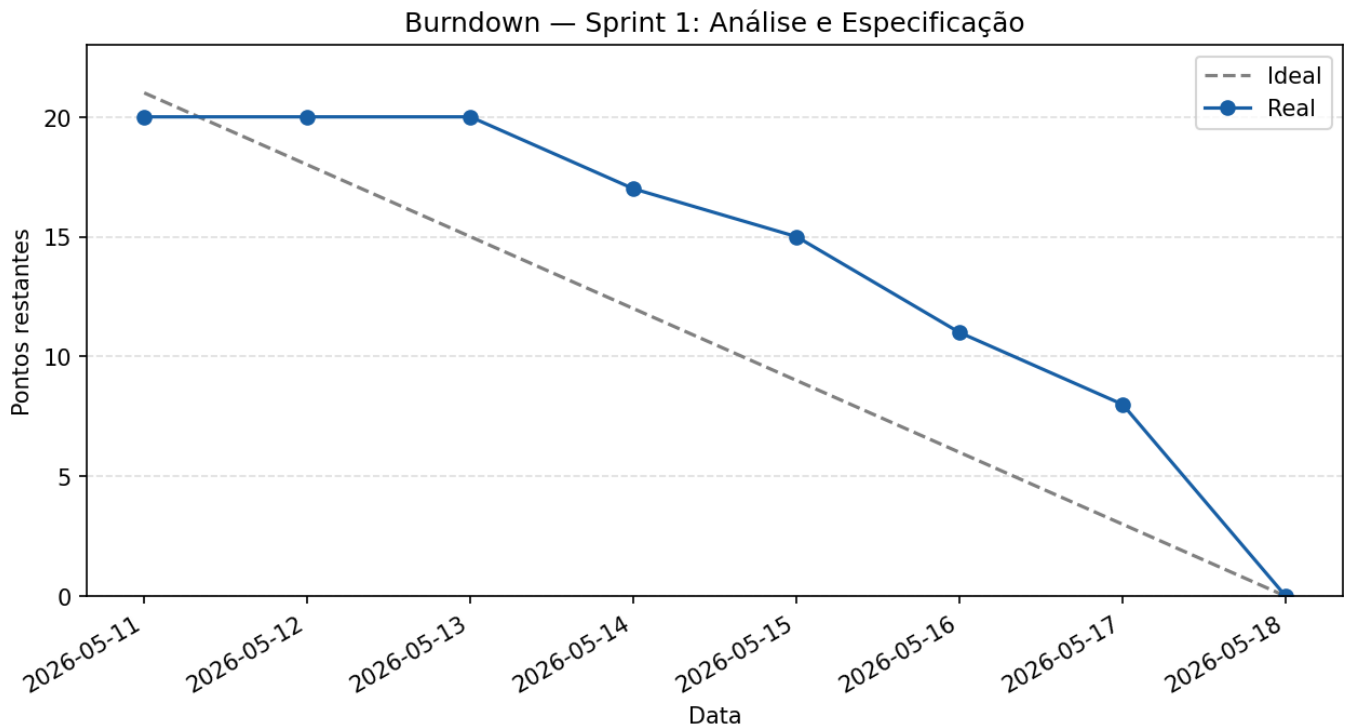

Artefatos produzidos

- Documento de descrição do sistema
- Especificações dos requisitos com histórias de usuário
- Repositório Git
- Diagrama de casos de uso
- Diagrama de arquitetura da solução
- Diagrama Entidade-Relacionamento
- Protótipo de média fidelidade
- Docker Compose com PostgreSQL e pgvector configurado
- Script SQL de criação do banco

Retrospectiva

O que funcionou bem

A equipe chegou a uma definição interessante do tema do projeto e conseguiu alinhar o tema aos requisitos técnicos da disciplina, produzindo todos os artefatos previstos dentro do prazo

O que não funcionou

A sprint teve início desorganizado em por causa de mudanças na composição da equipe. A produção ficou concentrada nos últimos dias desnecessariamente. A conciliação com a rotina fora da faculdade foi um fator muito limitante

O que muda na próxima sprint

Distribuir o trabalho de forma mais uniforme ao longo da semana, com alinhamentos diários entre os membros pelo WhatsApp para evitar que as entregas se acumulem próximo ao prazo

