

LicitAI — Relatório Sprint 2

Sprint 2 Camada de Orquestração de Dados (ETL)

Período: 18 de maio a 25 de maio de 2026 Total de pontos: 22 Todas as tarefas foram concluídas

Planning Poker


Tarefa	Alan	Luís Henrique	Pontuação final
LIC-14 Transformação e limpeza dos dados (normalização de CNPJ, datas, valores nulos)	3	3	3
LIC-13 Extração dos itens de cada licitação via endpoint de itens da API PNCP	5	3	3
LIC-12 Crawler Python funcional buscando contratações por intervalo de datas e modalidade	5	4	4
LIC-15 Carga incremental no PostgreSQL (upsert por numeroControlePNCP)	3	3	3
LIC-18 Logs estruturados e tratamento de erros e retries na coleta	2	2	2
LIC-16 Coluna tsvector gerada automaticamente sobre objetoCompra e órgão	3	3	3
LIC-19 Testes de integração do pipeline de ponta a ponta	5	3	4

Kanban

🔗 LIC-2 Sprint II: Camada de Orquestração de Dados (ETL)		
🔗 LIC-14	Transformação e limpeza dos dados (normalização de CNPJ, datas, valores nulos)	FEITO LH
🔗 LIC-13	Extração dos itens de cada licitação via endpoint de itens da API PNCP	FEITO LH
🔗 LIC-12	Crawler Python funcional buscando contratações por intervalo de datas e modalidade	FEITO LH
🔗 LIC-15	Carga incremental no PostgreSQL (upsert por numeroControlePNCP)	FEITO LH
🔗 LIC-18	Logs estruturados e tratamento de erros e retries na coleta	FEITO AN
🔗 LIC-16	Coluna tsvector gerada automaticamente sobre objetoCompra + órgão para full-text sear...	FEITO AN
🔗 LIC-19	Testes de integração do pipeline de ponta a ponta	FEITO AN

Quadro Kanban da Sprint II

Burndown

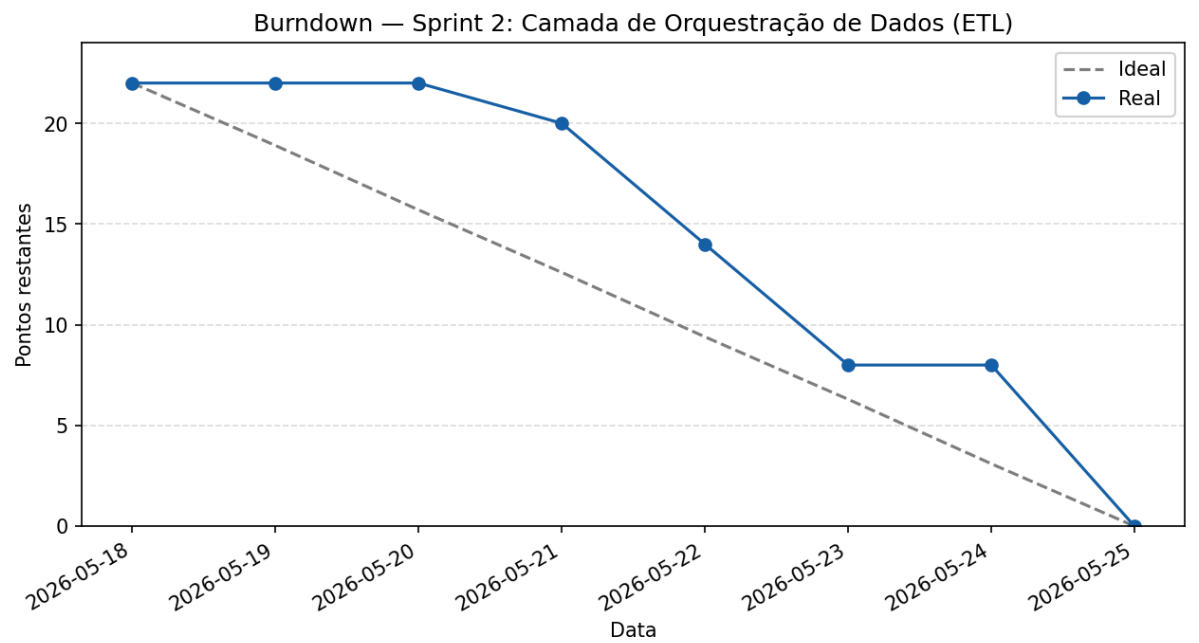

Burndown Sprint 2

Artefatos produzidos

Crawler ETL

Módulo Python funcional de coleta, transformação e carga de licitações do PNCP no PostgreSQL

Demais artefatos

- [Repositório do projeto](#)
- [Repositório de documentação](#)

Retrospectiva

O que funcionou bem

A sprint teve um volume alto de entregas técnicas e o time conseguiu superar as dificuldades de acesso à API do PNCP, desenvolvendo soluções de retry e tratamento de erros que tornaram o crawler funcional. Houve uma sensação melhor de distribuição do trabalho em relação à sprint anterior

O que não funcionou

Os mesmos problemas da sprint anterior se mantiveram: dailies sem constância e acúmulo de entregas no final da sprint. As restrições da API do PNCP geraram retrabalho e consumiram tempo não planejado

O que muda na próxima sprint

Apesar da melhora na percepção de distribuição, o acúmulo no final da sprint ainda é um problema recorrente. O time precisa transformar essa sensação de melhora em resultado concreto, evitando que tarefas críticas fiquem para os últimos dias
